Ctra. Tarragona km.75,3. 25430 Juneda (Lleida)


+34 973 15 03 09 · +34 616 49 43 90
info@ppalau.com · www.ppalau.com

QUESTIONNAIRE INFOS CADRES

Date:
Adresse chantier:
Entreprise:
Adresse entreprise:
Interlocuteur:
Email:
Tél:

Statut du projet:

DP
AC/Etude ☐
Exécution ☐
Date des travaux:

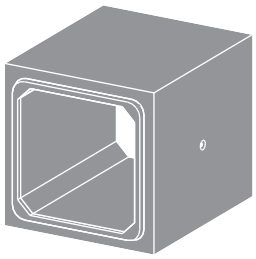

Merci de bien vouloir indiquer les caractéristiques dimentionnelles de l'ouvrage: (En absence de plan coté*, un croquis...)

Linéaire d'ouvrage (m):
Largeur intérieure (m):
Hauteur intérieure (n):
Nappe Phréatique (Hauteur depuis le fil d'eau):

Merci de bien vouloir joindre un plan ou à défaut, un croquis (avec une cotation en plan et en élévation...)

Données techniques:

☐ Galerie technique
☐ Ouvrage hydraulique OH
☐ Stockage m^3

Cocher, la catégorie

Hypothèses soutraitées par la maitrise d'oeuvre (Merci de nous adresser les extraits de CCTP concernés):

Remblais: ☐ 0.30 à 3.00m par défaut Autre (Préciser):

Position de l'ouvrage: ☐ Perpendiculaire ☐ Parallèle ☐ Biais (°):

Enrobage: ☐ 30mm par défaut Autre (Préciser):

Classe d'exposition: ☐ XC4/XF1 par défaut Autre (Préciser): (Sauf XF3 et XF4)

Extrémité de l'ouvrage: ☐ 2 Têtes droites Autre (Préciser):

Obturation: ☐ Aucunes ☐ Côté mâle ☐ Côté femelle

Réservations: ☐ Quantités, dimensions, positions:

Performance Béton: ☐ C40/50 par défaut Autre (Préciser):

Surcharges admissibles: ☐ Convoi 5.20m entre essieu de 150KN roue type B (Eurocodes)

☐ Autre (Préciser):

Observations et options:

Pour les pièces spéciales, joindre un croquis ou des plans des éléments souhaités, n'hésitez pas à décrire les spécifications de votre projet.
Nous indiquerons les hypothèses retenues sur notre offre si certaines n'étaient pas connues pour ce chiffrage.
Les hypothèses retenues par défaut seront évidement à contrôler par le maître d'oeuvre ou le bureau d'étude en charge du projet.
